

开平市重点项目推进领导小组办公室

简 报

(2022 年第 4 期)

开平市重点项目推进领导小组办公室

2022 年 5 月 23 日

市发改局深入基层督查调研重点项目情况

2022 年度开平市重点建设项目共 164 项，总投资 894 亿元，年度投资计划 165.4 亿元。1-4 月，累计完成投资 54.2 亿元，完成年度投资计划的 32.8%，略慢于时间进度 0.6 个百分点。为了促进我市重点项目建设，争取中期完成投资达到 70% 的目标，5 月 19、20 日，市发改局唐海平副局长带队到金鸡镇、赤水镇、百合镇等 8 个镇开展为期两日的项目现场督查调研工作，重点了解新项目前期工作进展、开工情况，并收集企业项目存在困难及问题、需上级协调帮助事项，协助为企业排忧解难。


投资总体进度快于时间进度的有 3 个镇。其中，赤坎镇共 8 个正式项目，年计划投资额 17.6 亿元，1-4 月累计已完成投资

7.6 亿元，投资完成率 43.2%，快于时间进度 9.9 个百分点；大沙镇共 5 个正式项目年计划投资额 1.7 亿元，1-4 月累计完成投资 0.72 亿元，投资完成率 42.3%，快于时间进度 9 个百分点；沙塘镇共 4 个正式项目，年计划投资额 2.4 亿元，1-4 月累计完成投资 0.99 亿元，投资完成率 41.1%，快于时间进度 7.8 个百分点。部分项目已完成厂房等主体工程建设，如广东双匠新型环保建材科技有限公司年产 2 万吨烧结砂建设项目、开平市卡莎蒂家具有限公司家具生产项目。唐海平副局长对项目单位高质高效的工作作风表示充分地肯定，并强调项目单位继续坚持稳中求进的工作总基调，树立担当作为的精神观念，全面抓好贯彻落实，推进重点项目建设工作。

投资总体进度慢于时间进度的有 5 个镇。其中，金鸡镇共 6 个正式项目，年计划投资额 6.85 亿元，1-4 月累计完成投资 1.4 亿元，投资完成率 20.5%，慢于时间进度 12.85 个百分点；赤水镇共 2 个正式项目，年计划投资额 0.8 亿元，1-4 月累计完成投资 0 亿元，投资完成率 0%，慢于时间进度 33.3 个百分点；百合镇共 5 个正式项目，年计划投资额 1.67 亿元，1-4 月累计完成投资 0.28 亿元，投资完成率 16.9%，慢于时间进度 16.4 个百分点；马冈镇共 10 个正式项目，年计划投资额 2.46 亿元，1-4 月累计完成投资 0.66 亿元，投资完成率 26.9%，慢于时间进度 6.46 个百分点；苍城镇共 6 个正式项目，年计划投资额 7.7 亿

元，1-4 月累计完成投资 1.9 亿元，投资完成率 24.7%，慢于时间进度 8.6 个百分点。总体进度慢的主要原因有：一是新项目较多，部分未能按计划动工；二是征地未落实、办理环评、能耗审批、厂房图纸规划审批等手续导致个别项目前期工作办理时间长等。

越是困难越要坚定信心、越要真抓实干。百年变局叠加世纪疫情，我们面临的外部环境更趋复杂严峻和不确定，社会经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。重点项目建设作为经济发展的重中之重，项目单位必须积极担当作为、付出艰苦努力，坚持稳字当头、又要稳中求进，努力完成我市全年重点项目建设发展目标。

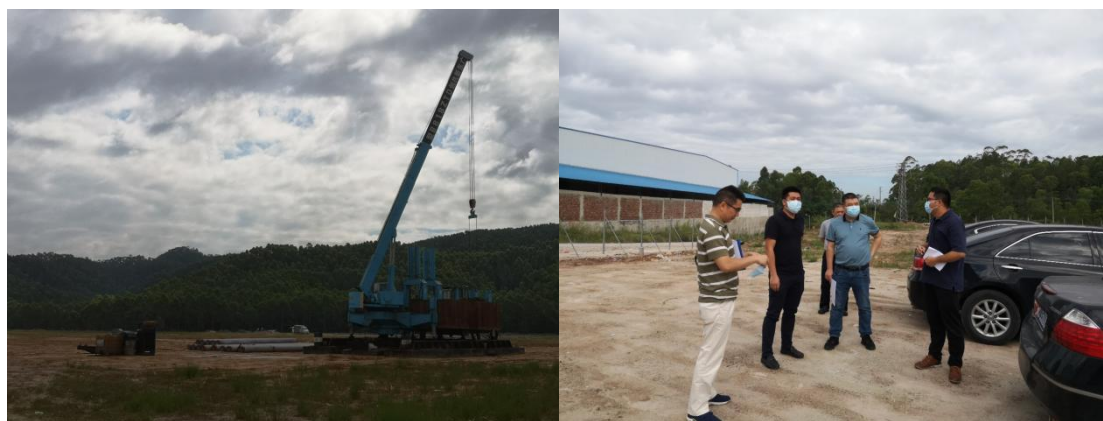

（金鸡镇项目现场）



(赤水镇项目现场)



(百合镇项目现场)



(赤坎镇项目现场)



(大沙镇项目现场)



(马冈镇项目现场)



(苍城镇项目现场)



(沙塘镇项目现场)
